


# 6車線化工事 週間規制全体図

4月22日(月)～4月28日(日)

2019年4月15日 時点

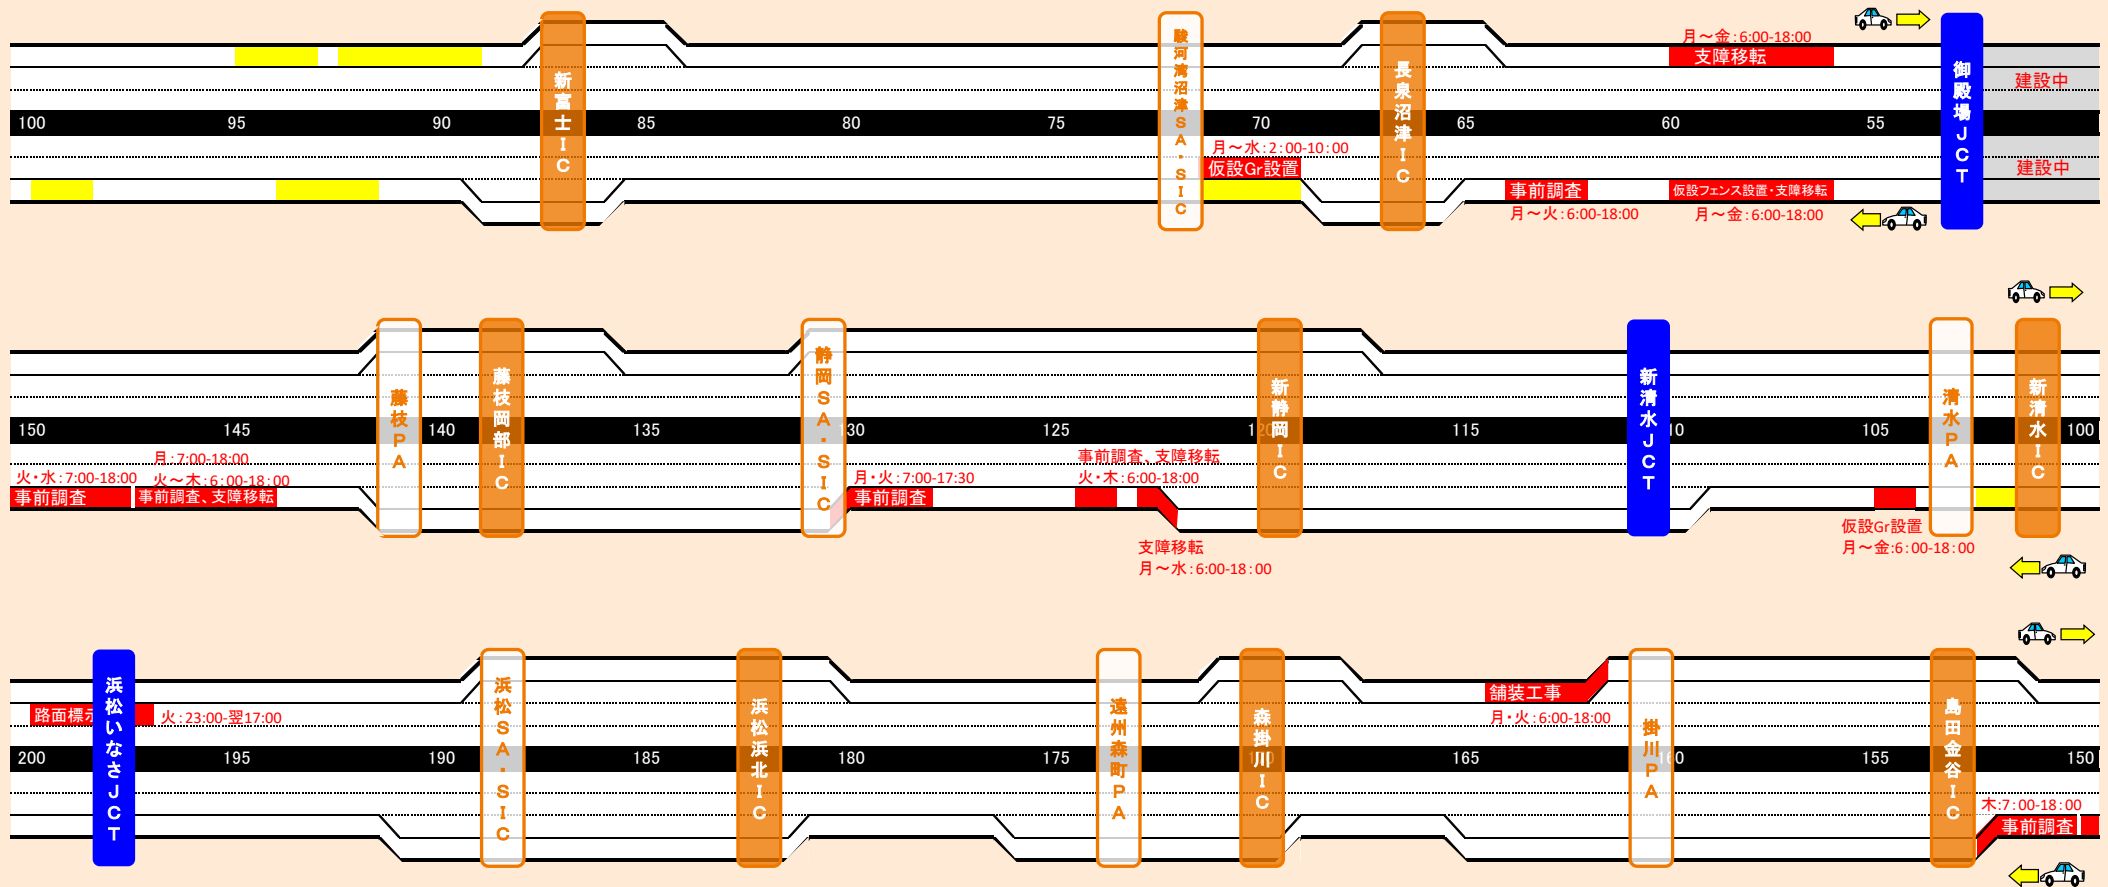

**《凡例》**

上り線 (東京方面) →

下り線 (名古屋方面) ←

車線規制(赤)

路肩

走行車線

追越車線

追越車線

第二走行車線

第一走行車線

路肩

固定規制(黄)

路肩固定規制設置イメージ

**工事内容**

事前調査 : 工事を行う前の測量等を行います

仮設Gr設置 : 路肩固定規制のための防護柵を設置します

仮設フェンス設置 : ガードレールに目隠しフェンスを設置します

TN内舗装 : トンネル内の増える車線の舗装工事を行います

TN照明工事 : トンネルの照明を改良する工事を行います

床版防水 : 橋梁床版の防水工を行います

支障移転 : 工事の際に支障となる標識等の移設を行います

◆◆週間規制予定図は2週間毎に更新を行います。◆◆

◆◆工事進捗、天候、事故、その他の事象により、規制が中止または変更する事があります。◆◆

◆◆出発前に公式ホームページ 工事規制予定MAPをご確認ください。◆◆
